資料１

処分場建設工事の状況について

令和８年８月８日
一般財団法人　茨城県環境保全事業団

整備の経過　令和６年６月　工事着工



整備の経過　令和７年５月　工事開始１年経過



整備の経過　令和８年８月　工事開始２年２カ月経過



エコみらいひたち完成予定図

埋立地エリア

浸出水地下水
集水ピット

管理施設エリア

新設道路
（県土木部工事）

環境学習施エリア

防災調整池

浸出水処理施設

第１浸出水
調整槽

第２浸出水
調整槽（R9～施工）

令和８年７月27日　ドローン撮影

工事の作業状況

埋立地エリア（北側工区）



埋立地エリア（南側工区）



貯留構造物



モルタル吹付工（遮水工下地処理）



令和8年7月30日撮影

工事の作業状況

管理施設エリア



浸出水処理施設



防災調整池




第１浸出水調整槽



令和8年7月30日撮影

工事の工程について

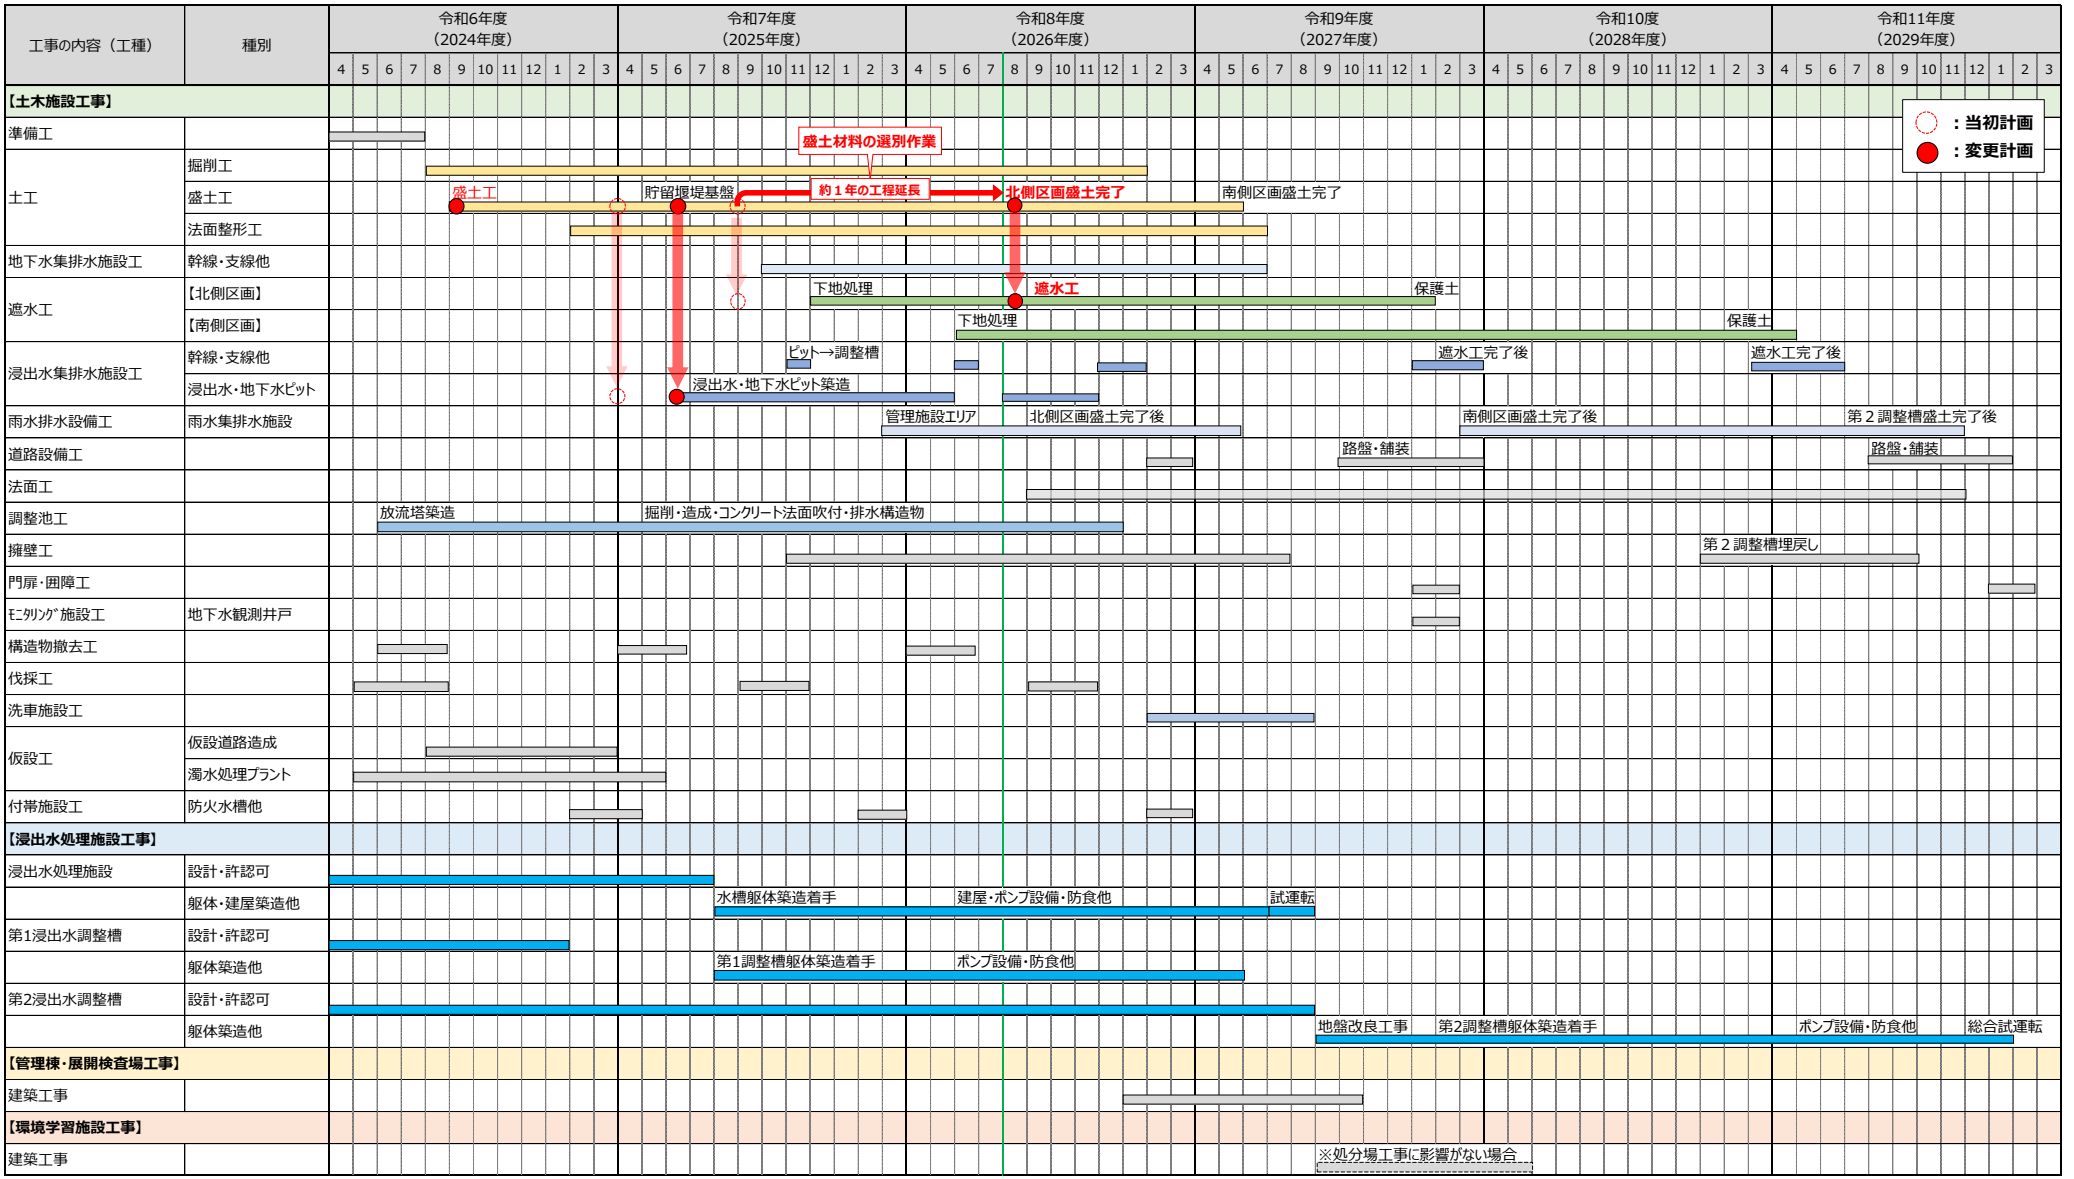

※令和８年８月時点、工事状況などにより変更となる場合があります。

盛土材料の選別作業について

＜試験施工＞



＜粒度試験＞



＜含水比測定＞



管理基準値：廃棄物荷重を想定した地盤強度
（変形係数24MN/㎡以上か）

管理基準値を満たす

管理基準値を満たさない

礫質土




試験転圧



運搬・敷き均し転圧




品質管理

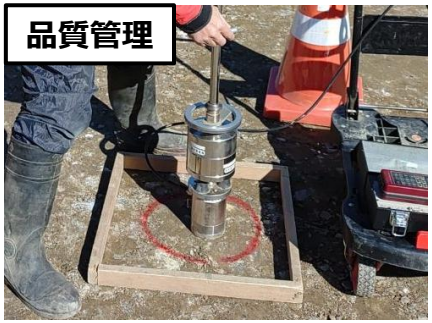


盛土に使用

粘性土

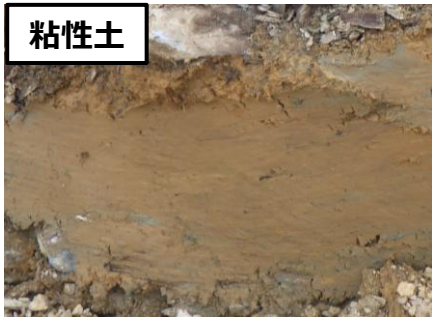

試験転圧

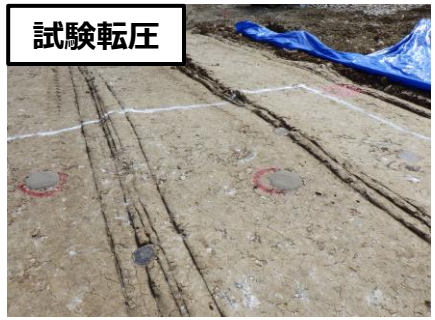

試料採取



搬出



盛土に使用できず、選別・搬出作業が必要 → **工程延長の要因**

広報活動について

【新聞折込チラシ・広報誌の配布】







◆日立市内全域向け新聞折込･･･R6年5月～計４回発行
◆地元４学区向け広報誌　　･･･月１回程度、Vol.24発行

【現地見学会の実施】





◆地元住民の皆様の理解を深めるため実施･･･計７回開催
◆事業団HPや施工業者HPにて情報発信
